R4 レースイ地区　予防治山測量設計調査委託業務
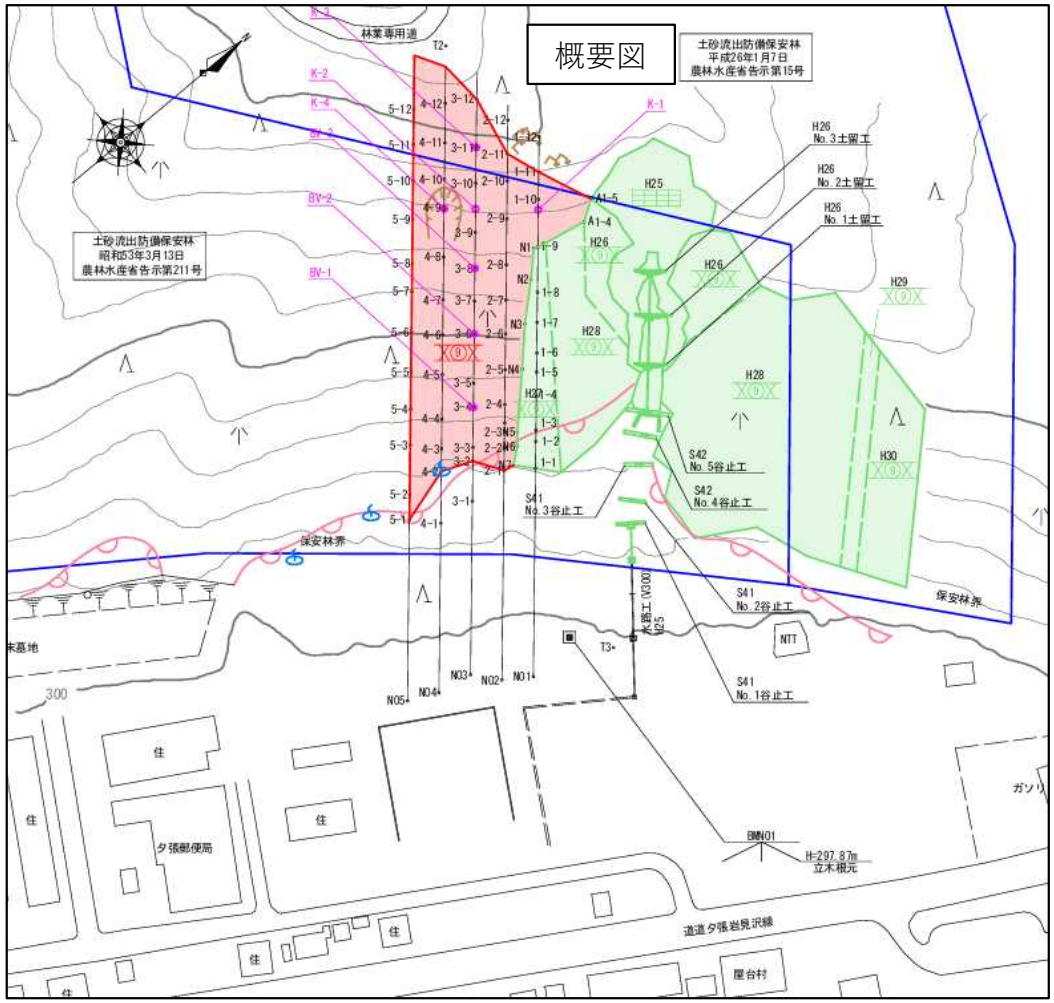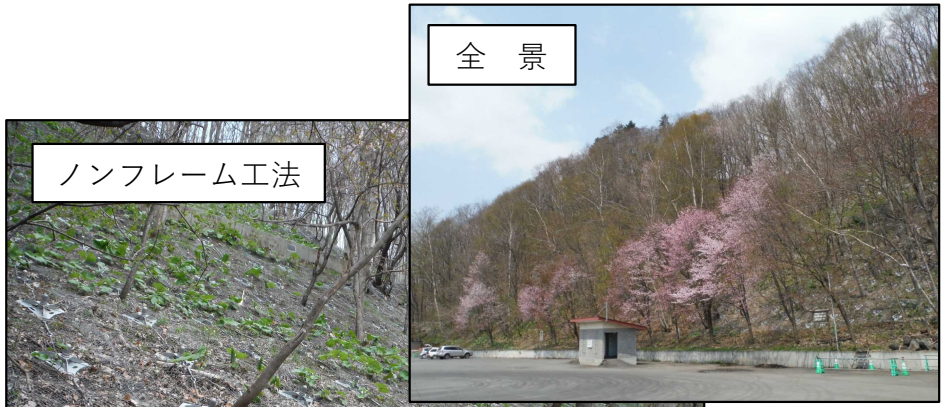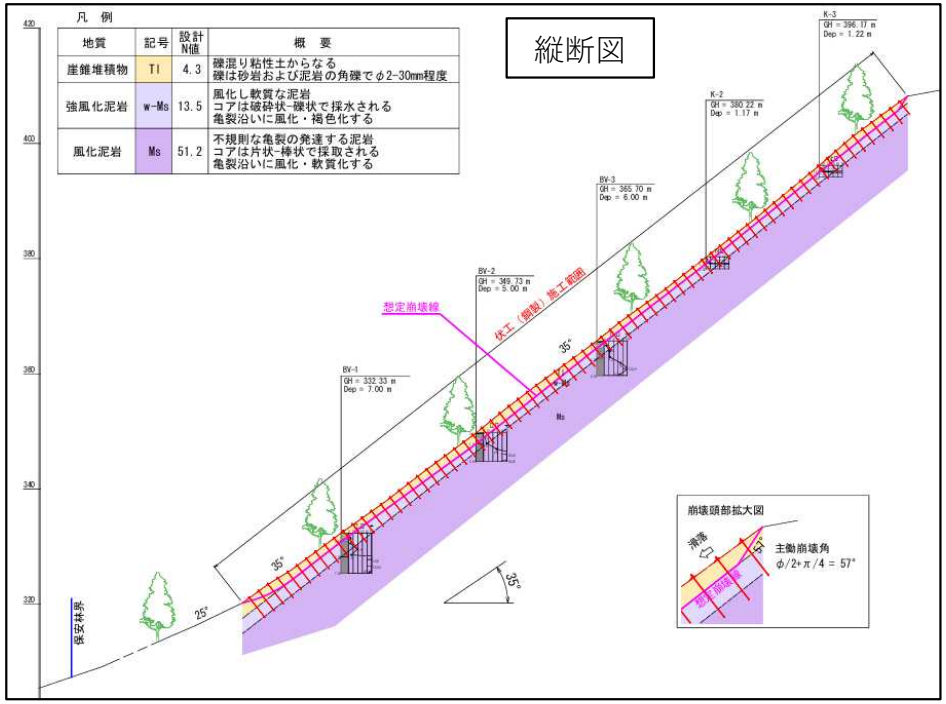
発注機関：空知総合振興局産業振興部林務課
委託内容：未対策地で長大斜面の表層崩壊が想定されることから、対策工の調査設計を実施
崩壊土層深が1～1.5m程度なので伏工（鋼製）を実施
令和4年5月16日～令和4年10月31日　21,321千円
山腹測量 0.50ha（測量・設計）
ノンフレーム工法を実施
